

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО МОДУЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРАМ ДЛЯ ОФИСОВ

Адрес поставки: Мирзо Улугбек район 3-й проезд Дархонтепа 1, ЖК OZ MAHAL


Характеристики:



- Контейнеры предназначены для организации рабочих мест.
- Площадь вмещает до 30 рабочих мест.
- Необходима пристройка из 5 контейнеров с возможностью перемещения (модульный контейнер).
- Подведение всех коммуникаций и подключений
- Учесть моменты ОТ и ТБ
- Монтаж теплоизоляции

Образцы указаны в приложении №1

Перечень необходимых материалов:

№	Наименование	Кол-во
1	Контейнер для офиса	5 шт
2	Пластик бм	200 кв.м
3	Рейка 3x4	960 шт
4	Рейка 4x5	140 шт
5	Утеплитель	50 шт.
6	Кабел Узб. 2x1,5	500 м
7	Кабел Узб. 2x2,5	750 м
8	Таркетт для пола	160 кв.м
9	Кафель 30x30	50 кв.м
10	Клей для кафеля	60 шт
11	Сетка для кафеля	50 кв.м
12	Фуга	5 кг
13	Саморез черный 7 см	10кг
14	Саморез черный 3 см	20кг
15	Саморез черный 5 см	10 кг
16	Саморез желтый 3 см	20 кг
17	Саморез желтый 7 см	10 кг
18	Агроф	2000
19	Акфа фасадный	72 кв.м
20	Алюкофон фасадный	100 кв.м
21	Профнастиль	120 кв.м
22	Каркас деревян.	500 м
23	Внутрен. Дверь АКФА	1шт
24	Окошка АКФА	2 шт
25	Раковина	2 шт
26	Унитаз	2 шт
27	Аристон	1шт
28	Лесница	1 шт
29	Сантехнич. Товары	100%
30	Блистер	1000 шт
31	Дверь наруж.	3шт
32	Клей МДФ	20шт
33	Клей селекон	50шт
34	Стяжка для балкона с каркасом	30 кв.м
35	Ограждение металлическое для балкона	1 шт
36	Установка и монтаж	100%
37	Логистика	



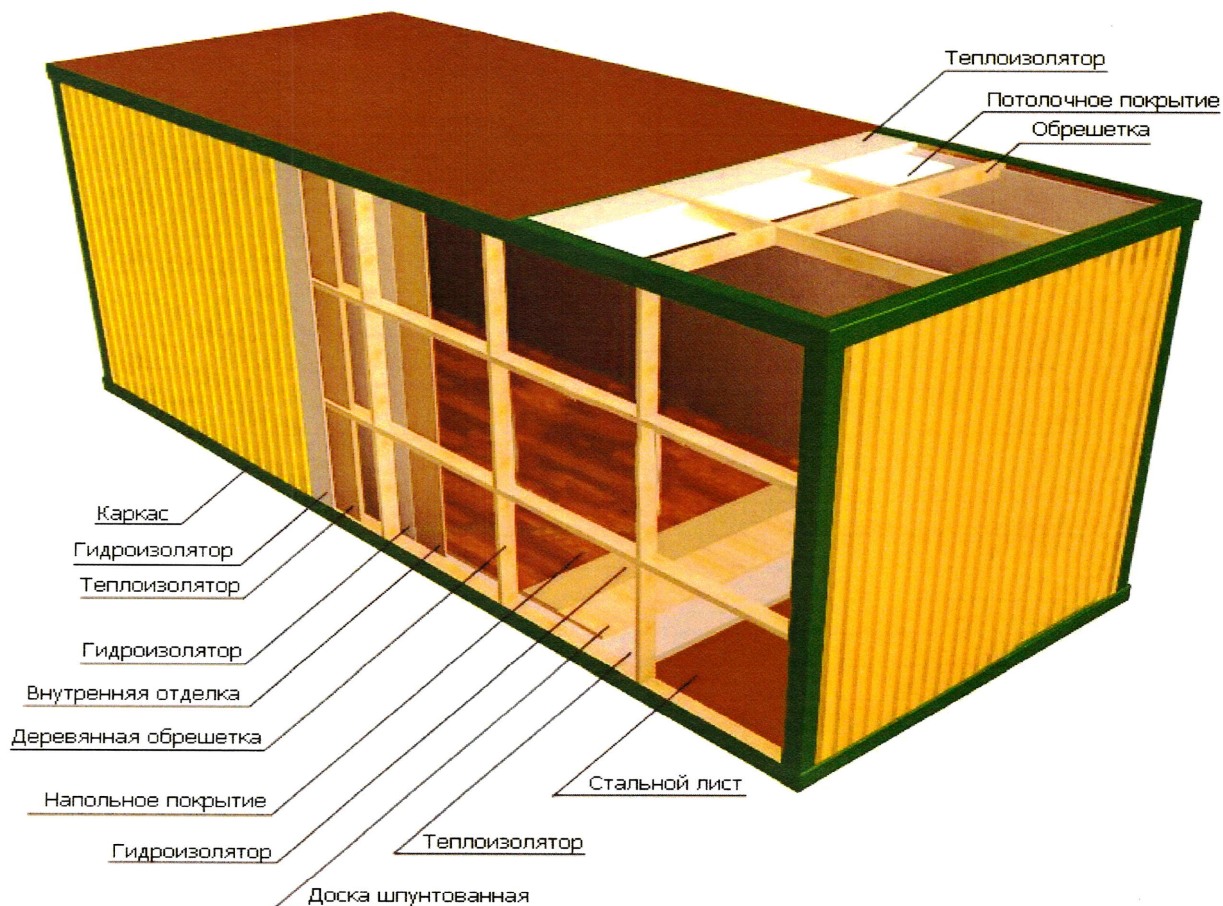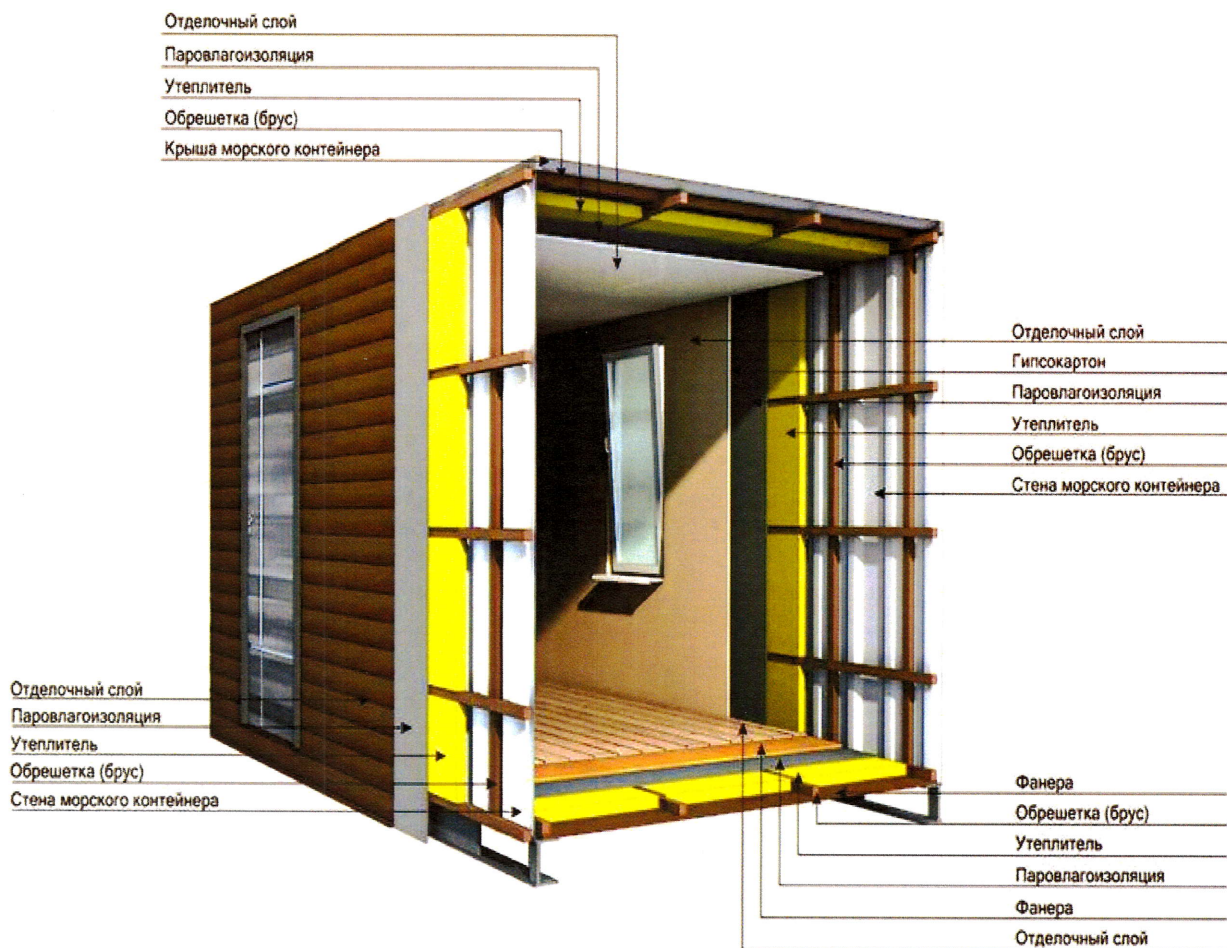

Образцы модульных контейнеров для офиса



